



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL (GESTIÓN 2024)

***DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL***

***GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE INCAHUASI***

FDO. 26 DE ENERO 1970



PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL GAMI



“CONST. SILO PARA ALMACENAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA COMUNIDAD JOLENCIA”



ESTADO	EJECUCION
CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (IPD-SA)	1.400.000,00
CONTRAPARTE GAMI	600.000,00
MONTO CONTRACTUAL DEL PROYECTO	1.997.736,81
% AVANCE FISICO Y FINANCIERO	50,07 %
ESTADO	EJECUTANDO EL PROYECTO
PLAZO	155 D.C.






“CONST. DE BORDILLOS CALLES CONSOLIDADAS BARRIO LITORAL INCAHUASI”



ESTADO	EJECUCION
FINANCIAMIENTO G.A.M.I.	193.996,75
ESTADO	100% AVANCE
PLAZO	60 D.C.

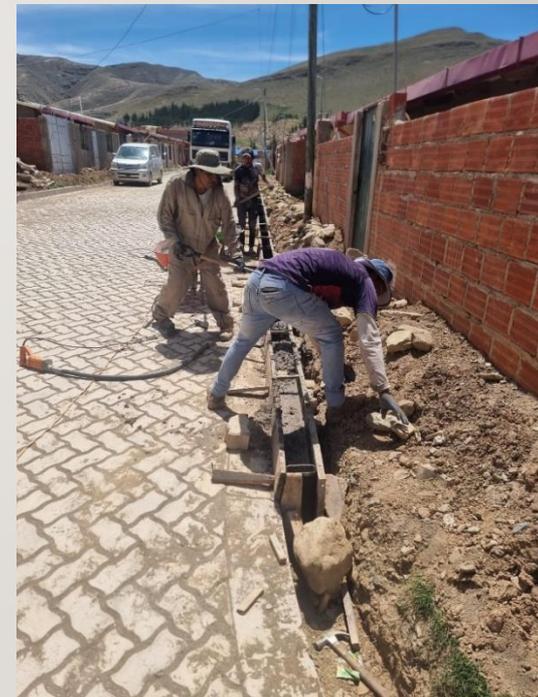



“CONST. SIST. DE RIEGO EL QUEMADO-INCAHUASI”



ESTADO	EJECUCION
CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (FDI)	1.491.668,48
CONTRAPARTE GAMI	130.165,542
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	1.621.834,02
PLAZO DE EJECUCIÓN	250 DIAS
ESTADO ACTUAL	AVANCE FÍSICO 39,07% AVANCE FINANCIERO 39,07%





PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DEL AJI



ESTADO	EJECUCION
COSTO PROYECTO COMPLETO (FPS)	7.348.749,00
FISCALIZACION	G.A.M.I
AVANCE FISICO Y FINANCIERO	100 %






“CONST. PLANTA PROCESADORA DE PAPA MUNICIPIO DE INCAHUASI”



ESTADO	EJECUCION
CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (EMAPA)	
% DE AVANCE DE OBRA ACTUAL	80%
ESTADO	SUSPENSIÓN TEMPORAL

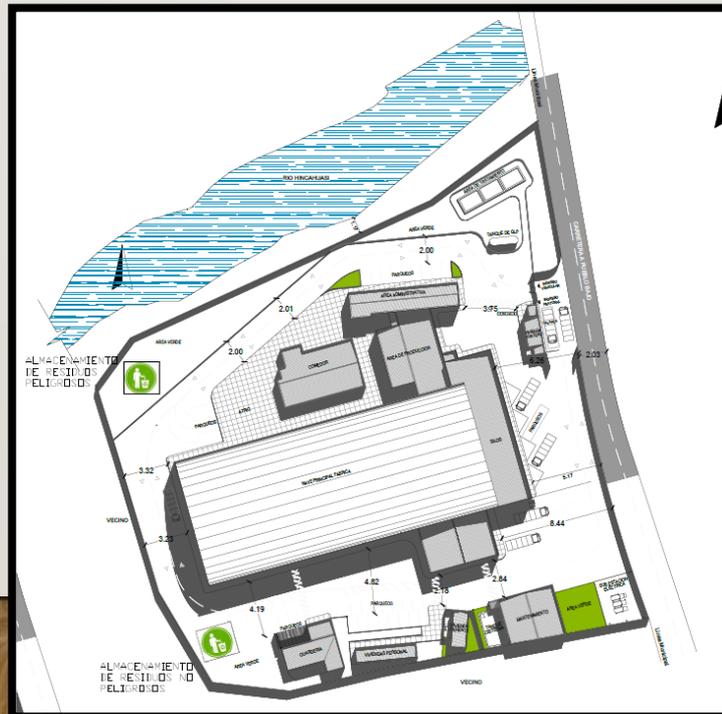



“CONST. UNIDAD EDUCATIVA LAMPAZAR-INCAHUASI”



ESTADO	EJECUCION
CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (UPRE)	4,106,372.532
CONTRAPARTE GAMI	0
MONTO TOTAL	4,106,372.532
ORDEN DE PROCEDER	
AVANCE FISICO	2,82%
AVANCE FINANCIERO	2,82%
ESTADO	PARALIZADO TEMPORALMENTE POR ASPECTOS TÉCNICOS, DE ACCESO Y CLIMÁTICOS.





“CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADAS BARRIO LITORAL INCAHUASI”



ESTADO	EJECUCION
CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (FPS)	2.025.523,56
CONTRAPARTE GAMI	0
MONTO TOTAL	2.025.523,56
ENTREGA DEFINITIVA	20/12/2024
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	100 %





REVISIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN



“E.D.T.P. CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD COCHALOMA”



ESTADO	EJECUCION
CONTRAPARTE MMAyA	1.009.390,26
CONTRAPARTE GAMI	0,00
MONTO TOTAL	1.009.390,26
BENEFICIARIOS	47 FAM / 205 HAB
ESTADO	SE CORRIGIO OBSERVACIONES Y SE VOLVIO A PRESENTAR EN FECHA 11 DE MARZO 24





“CONST. SIST. DE RIEGO PUCARA DE YATINA”



ESTADO	EJECUCION
CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (PAR III)	2.354.566,44 (80%)
CONTRAPARTE GAMI	588.642,41 (20%)
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	2.671.794,50
FECHA DE ELABORACION ESTUDIO	12/9/2023
ESTADO ACTUAL	El proyecto ya cuenta con Constructora y supervisión adjudicados.





“ELABORACIÓN DE I.T.C.P.”



- CONST. PRESA AGUA DE CASTILLA, SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, COMUNIDADES VALLE HERMOSO – PUEBLO BAJO (INCAHUASI)”

- “CONST. PRESA SANTA ROSA, SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, COMUNIDAD SULTACA BAJA SECTOR 1 (INCAHUASI)
- “CONST. SIST. DE RIEGO POR BOMBEO Y TECNIFICADO COMUNIDAD SULTACA SECTOR 2 (INCAHUASI)”
- CONST. PRESA YURAC CABALLO, SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO COMUNIDADES SAN LUIS - PUEBLO ALTO - (INCAHUASI)
- CONST. PRESA SAN LORENCITO, SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN LORENCITO (INCAHUASI)
- CONST. SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO Y TECNIFICADO COMUNIDAD DE ENTRE RIOS (INCAHUASI)
- CONST. AGUA POTABLE COMUNIDADES DE MIRA FLORES - SAN LUIS (INCAHUASI)



“ELABORACIÓN DE PERFILES”



PARA EL AREA DE EDUCACIÓN


- **CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA U.E. 1ERO DE MAYO**
- **CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS U.E. EL FUERTE**
- **REFACCIÓN CUBIERTA U.E. LAMPAZAR**
- **REFACCIÓN CUBIERTA U.E. CHILLAJARA**
- **CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES U.E. BUENA VISTA**
- **REFACCIÓN U.E. SAN MARCELO**
- **REFACCIÓN U.E. SAN GREGORIO**

PARA EL AREA DE SALUD


- **REFACCIÓN CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL ROSARIO INCAHUASI**
- **CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PERSONAL DE SALUD COMUNIDAD DE LAMPAZAR**

PARA EL AREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

- **CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES COMUNIDAD EL FUERTE**

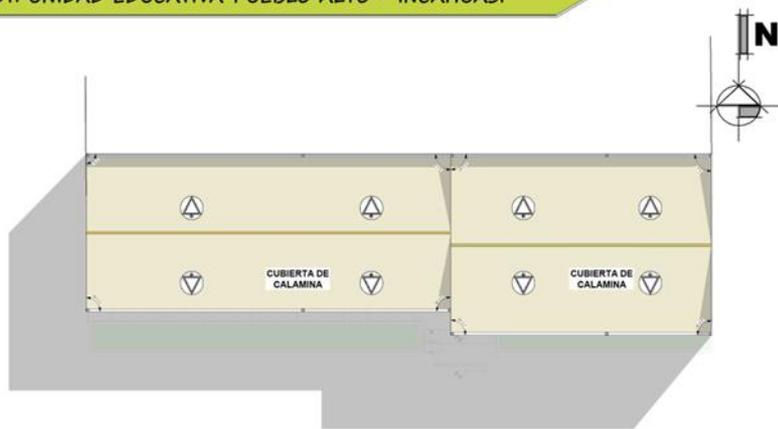


PLANO DE SITIO Y TECHOS
ESC: 1:100



PLANTA ACOTADA
ESC: 1:100



PLANTA AMOBLADA
ESC: 1:100



C
A
U
T
R
2
A
B
O
S
A
2
T
N
4
R
O
O



VERIFICACIONES - LÍNEA NIVEL

35 - 40



CASAS

LOTES

- SE REALIZÓ EL CONTROL E INSPECCIÓN DE VIVIENDAS Y LOTES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO.
- SE DIO LÍNEAS MUNICIPALES CON EL FIN DE ORDENAR Y DEFINIR LOS LOTES PARA QUE NO CONSTRUYAN FUERA DE LA LÍNEA MUNICIPAL.



TO TERRIT

LAMINA:

Entos Cambiamos
ASI
del Incahuasi



VERIFICACIONES - REPLANTEOS



Barrios centro poblado



San Luis Jolencia



Lampazar



LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS


LOTES




- ❖ PLANOS PARA PERFILES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI

- ❖ PLANTA PROCESADORA DE PAPA
- ❖ INSTALACIÓN ESTACIÓN DE GAS
- ❖ PLANOS COMUNIDADES PERSONALIDADES JURIDICAS
- ❖ ETC.

PLANO DE LOTE

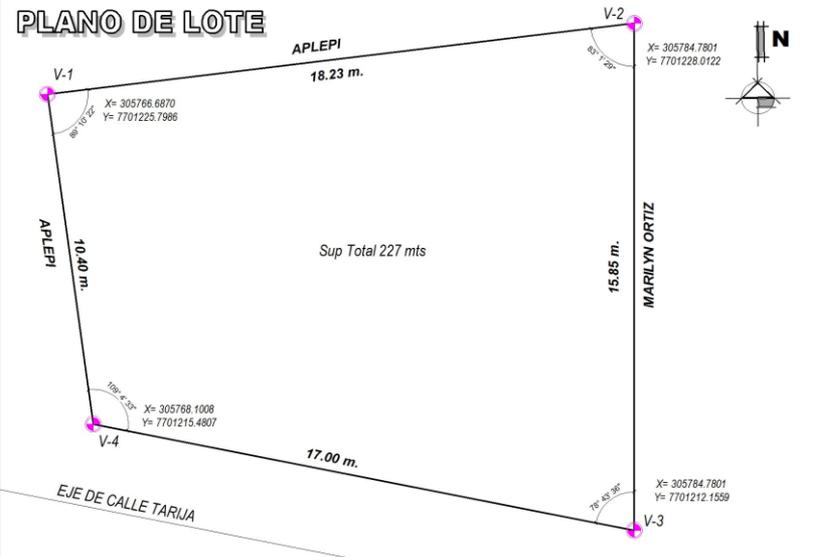

PLANOS	PROYECTO: LOTE DE TERRENO COMITE CIVICO INCAHUASI	FECHA: INCAHUASI / JUNIO / 2024	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL G.A.M. INCAHUASI	LAMINA: 1 / 3	ESCALA: 1:100	DIBUJO: ARQ. JOHELIN AMARO ORTIZ

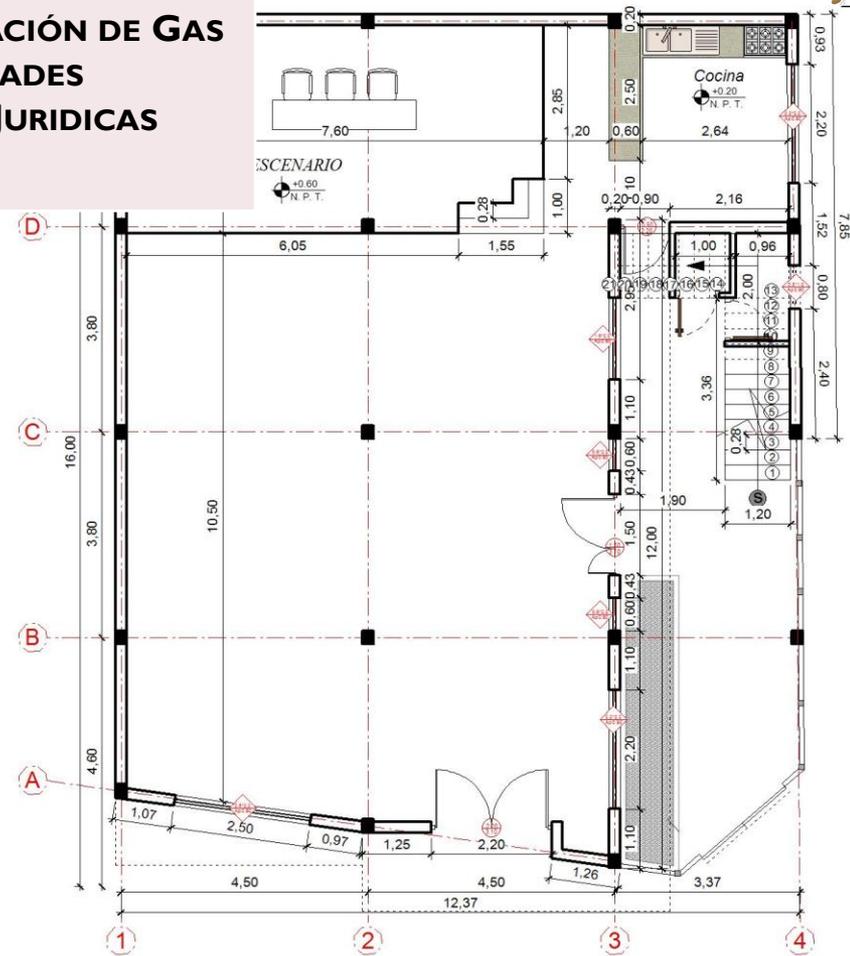



PLANTA ACOTADA

ESC. 1:100

PROYECTO: "SALON DE REUNIONES BARRIO LITORAL" DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI	DIBUJO: ARQ. JOHELIN AMARO ORTIZ	FECHA: 04 / 07 / 2024	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL G.A.M. INCAHUASI	LAMINA: 2 / 3	ESCALA: 1:100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL G.A.M. INCAHUASI

TERRENO INSTALACIÓN EQUIPOS GAS

EJE DE CALLE SANTA CRUZ

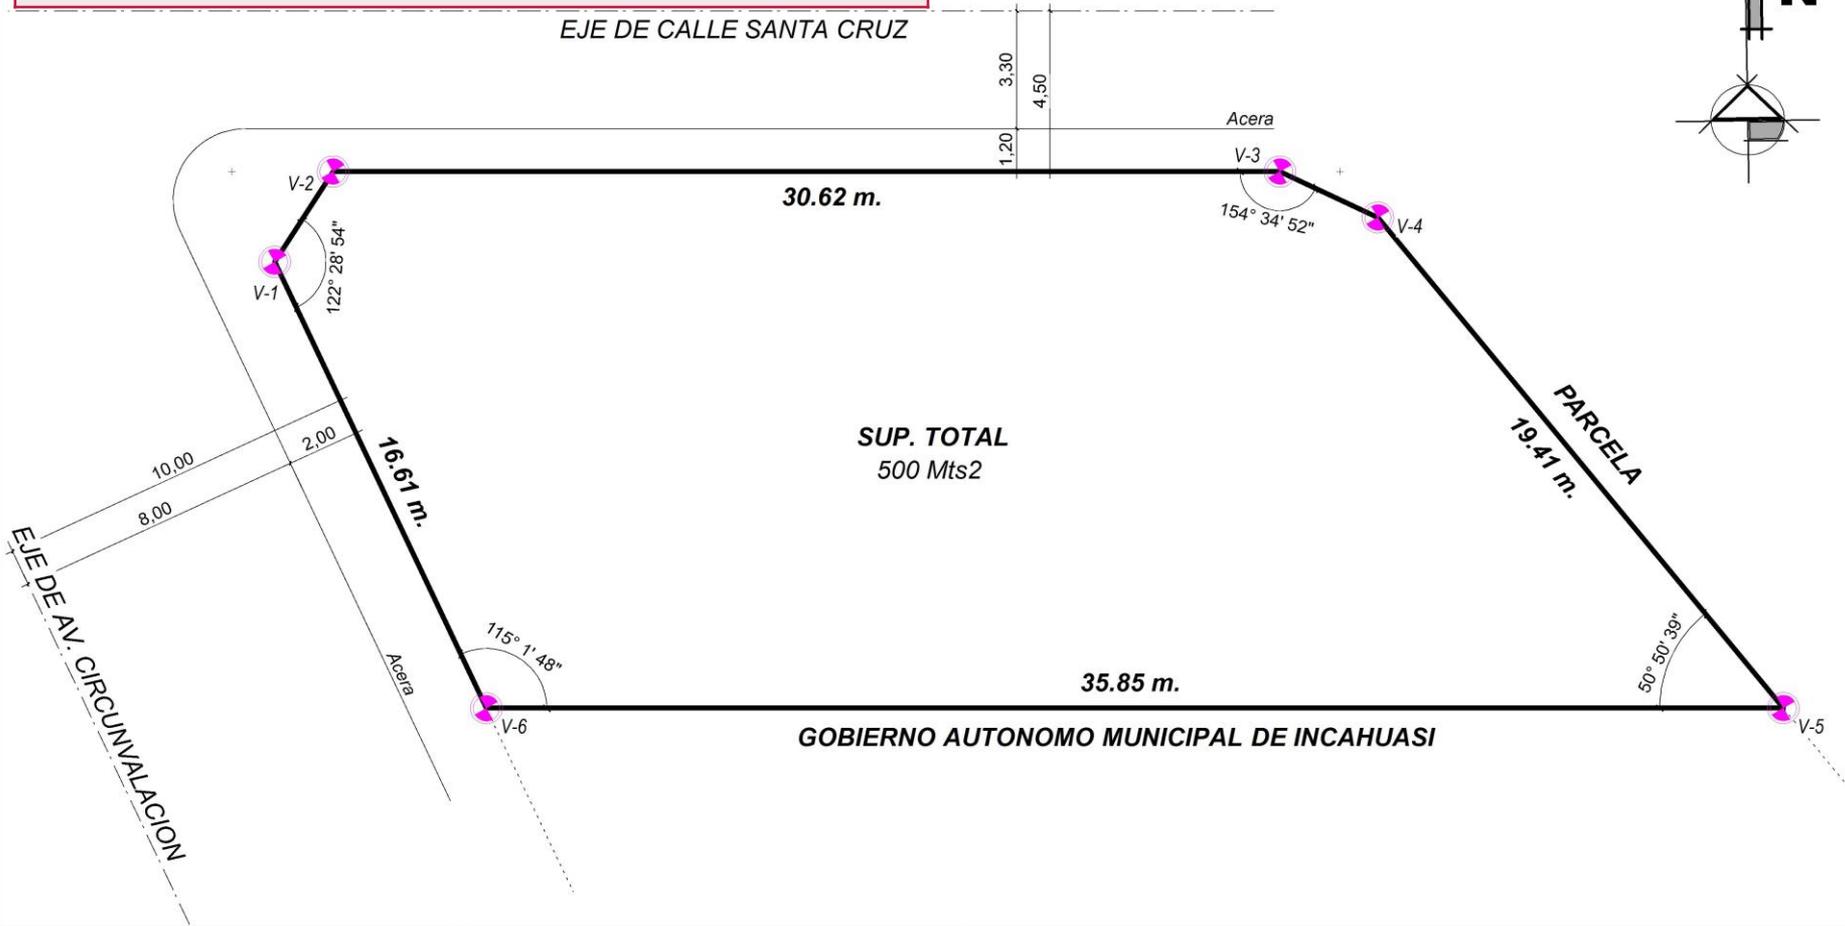

Coordenadas:

COORDENADAS PERIMETRO		
N	ESTE	NORTE
V1	7701129,380	306068,800
V2	7701131,910	306070,410
V3	7701131,910	306096,580
V4	7701130,630	306099,290
V5	7701116,870	306110,500
V6	7701116,860	306074,650

Ubicación:



TERRENO PARA LA INSTALACION DE MANIFOLD Y ESTACION
DISTRICTAL DE REGULACION PARA EL MUNICIPIO DE INCAHUASI



Superficie : 500.00m2

Fecha : INCAHUASI / JULIO / 2024

Escala : 1:200

Barrio : LITORAL

DIBUJO:
ARQ. JOSELIN AMARO ORTIZ




COMUNIDAD CAMPESINA PUCARA DE YATINA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE INCAHUASI

Departamento : Chuquisaca
Provincia : Nor Cinti
Seccion : Tercera
Municipio : Incahuasi



COMUNIDAD BANDA INCAHUASI

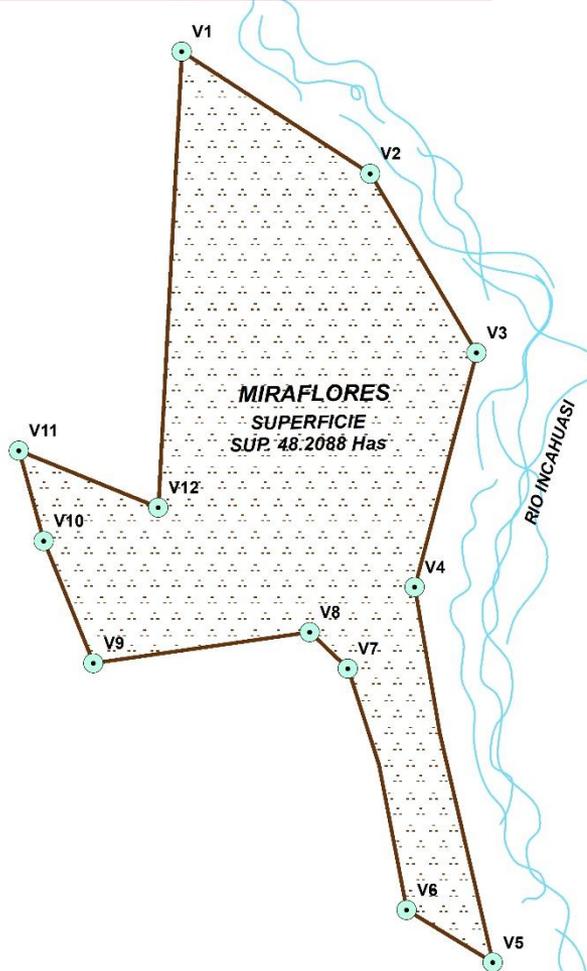

CENTRO POBLADO INCAHUASI


LEYENDA	
	VERTICES
	RIO INCAHUASI
	LA BANDA INCAHUASI

450 225 0 450 900 Meters

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE INCAHUASI



Departamento : Chuquisaca
Provincia : Nor Cinti
Seccion : Tercera
Municipio : Incahuasi
Comunidad : LA BANDA INCAHUASI
Escala Absoluta : 1:600

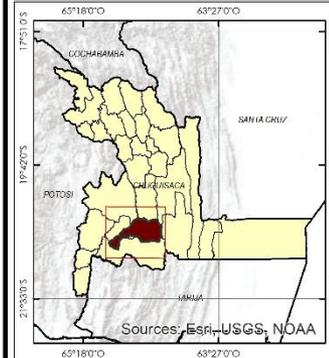

SUPERFICIE
48.2088 Has.


LISTADO DE COORDENADAS

DESIGNACION	VERTICES	
	X	Y
V1	7702445,888	304682,695
V2	7702243,544	304990,266
V3	7701946,890	305164,075
V4	7701558,662	305062,846
V5	7700936,496	305190,646
V6	7701023,811	305050,113
V7	7701423,667	304953,858
V8	7701483,971	304891,590
V9	7701432,598	304538,389
V10	7701635,143	304457,081
V11	7701784,823	304416,679
V12	7701690,515	304644,466




Arq. Urb. Jhoselin Amaro Ortiz
RESPONSABLE DE CATASTRO URBANO
G.A.M. INCAHUASI

PLANO DE L

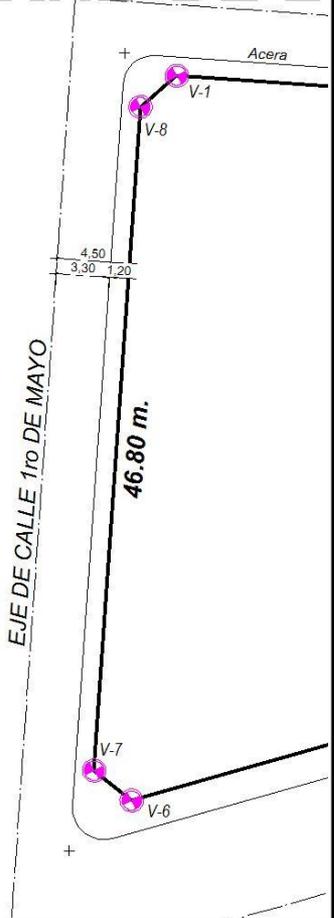


PLANO DE LOTS

ALTERNATIVAS 2

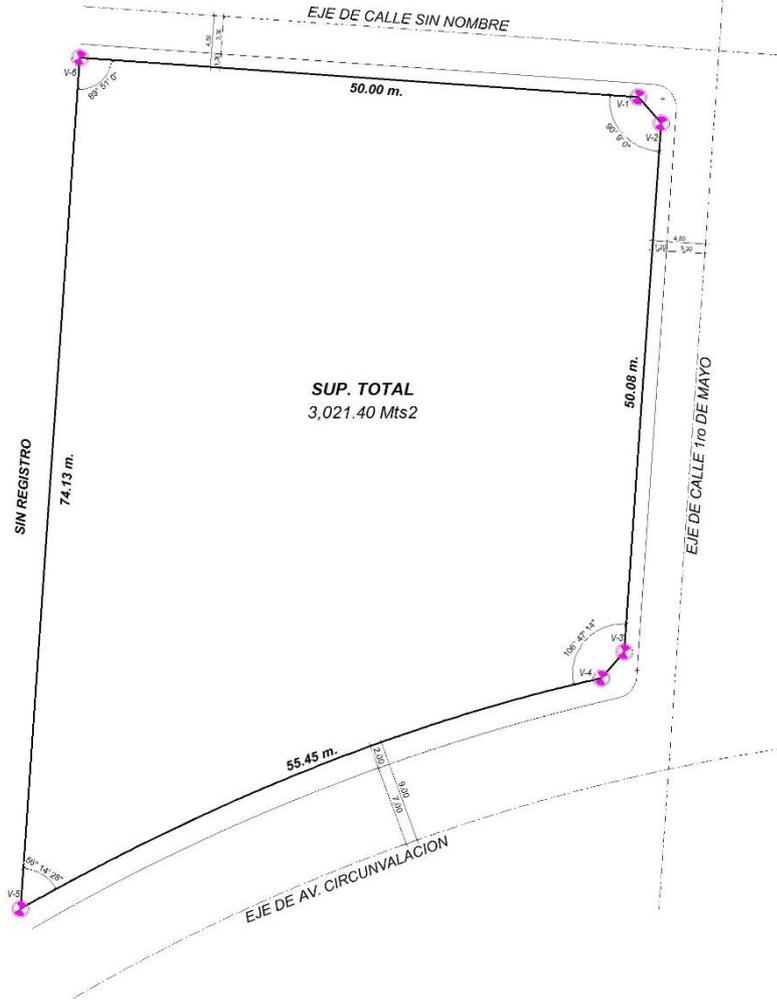

ALTERNATIVAS I

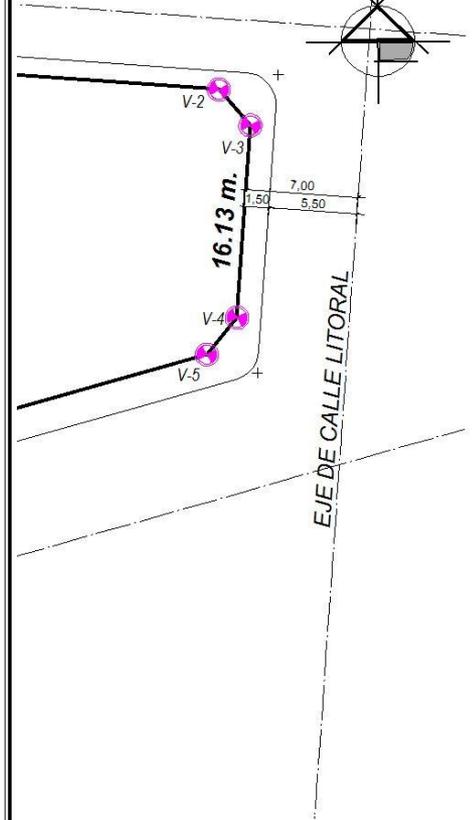

COORDENADAS PERIMETRO

N	ESTE	NORTE
V1	7700942,670	305805,460
V2	7700937,000	305884,870
V3	7700934,740	305886,840
V4	7700922,580	305886,000
V5	7700920,250	305884,120
V6	7700896,870	305802,640
V7	7700898,750	305800,310

COORDENADAS PERIMETRO	N	ESTE	NORTE
V1	7700943,580	305792,240	
V2	7700941,320	305794,210	
V3	7700895,370	305791,050	
V4	7700893,090	305789,100	
V5	7700873,040	305739,400	
V6	7700946,990	305744,480	

Ubicación:



ALTERNATIVA TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL SURTIDOR EN EL MUNICIPIO DE INCAHUASI



DIBUJADO: ING. JOSELIN AMARO ORTIZ

Superficie:	3,021.40m2
Fecha:	INCAHUASI / AGOSTO / 2024
Escala:	1:300
Barrio:	LITORAL

LA CONSTRUCCION DEL SURTIDOR EN EL MUNICIPIO DE INCAHUASI


Superficie: 2,628.85m2

Fecha: INCAHUASI / AGOSTO / 2024

Escala: 1:450




TRAMITE REGISTRO DE TRASFERENCIA POR EXPROPIACIÓN INRA (PROYECTO PAPA)

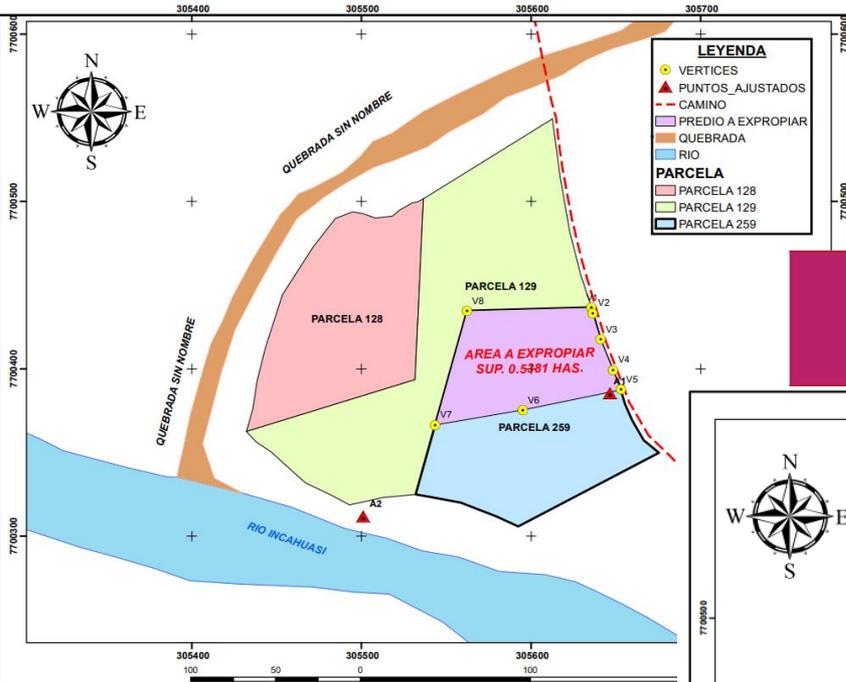

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INCAHUASI

Departamento : Chuquisaca
 Provincia : Nor Cinti
 Sección : Tercera
 Municipio : Incahuasi
 Comunidad : Pueblo Bajo
 Cod. Cat. : 010703035259
 Escala Absoluta : 1:600

TRAMITE FUSION DE PREDIOS PLANTA PROCESADORA DE PAPA

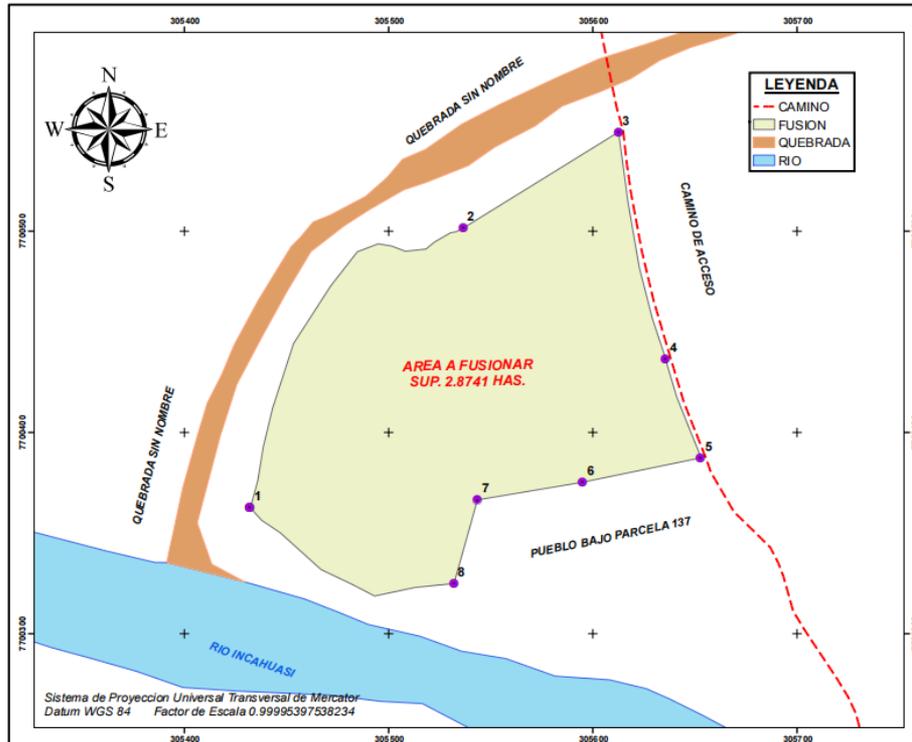

PLANO DE PROPIEDAD

NOMBRE DE PREDIO:
IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE PAPA PARA EL MUNICIPIO DE INCAHUASI

PROPIETARIO:
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INCAHUASI

UBICACION:
Departamento : Chuquisaca
Provincia : Nor Cinti
Municipio : Incahuasi

SUPERFICIE: 2,8741 HA.

ESCALA: 1:1,500

COLINDANCIAS:
NORTE: QUEBRADA SIN NOMBRE
ESTE: CAMINO DE ACCESO
OESTE: QUEBRADA SIN NOMBRE
SUR: RIO INCAHUASI Y PUEBLO BAJO PARCELA 137

COORDENADAS:

Nº	VERTICE	NORTE	ESTE	DISTANCIA	ASUMT
1	10850157	77003522	30543279	193,8	53° 08' 52"
2	10850213	770031584	305535508	86,9	32° 06' 27"
3	10850284	7700349342	305612619	115,0	281° 33' 8"
4	10850214	7700426700	305583271	65,2	289° 54' 30"
5	11310089	770037432	305603204	50,1	191° 48' 52"
6	11310089	770035343	305568134	52,4	189° 42' 46"
7	11310087	770036503	305548485	43,1	254° 31' 20"
8	10850215	7700343597	305552018	159,8	159° 21' 0"
9	10850157	77003522	30543279	193,8	53° 08' 52"

CHUQUISACA NOVIEMBRE DE 2024



BENEFICIARIOS AL PROYECTO VIVIENDA SOCIAL

PROYECTO VIVIENDA NUEVA

❖ SAN PEDRITO - LA BANDA	❖ 25 BENEFICIARIOS	
❖ AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	❖ 2.890.975,25	❖ 98 %
❖ CONTRAPARTE G.A.M.I.	❖ 58.999,50	❖ 2 %
❖ TOTAL	❖ 2.949.974,75	❖ 100 %



BENEFICIARIOS AL PROYECTO VIVIENDA SOCIAL

PROYECTO VIVIENDA CUALITATIVA

❖ CHICHAPAMPA - JOLENCIA	❖ 40 BENEFICIARIOS	
❖ AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	❖ 2.743.977,68	❖ 98 %
❖ CONTRAPARTE G.A.M.I.	❖ 55.999,55	❖ 2 %
❖ TOTAL	❖ 2.799.977,23	❖ 100 %





Gobierno Autónomo Municipal De Incahuasi

Creado Mediante D.S.09069 del 26 de enero de 1970

Provincia Nor Cinti - Chuquisaca - Bolivia

Facebook: Gobierno Autónomo Municipal De Incahuasi / Web: www.incahuasi.gob.bo

Correo: gam.incahuasi@gmail.com / Radio Incahuasi FM 88.3

Dirección: Av. Junin N°3



RENDICION PUBLICA DE CUENTAS FINAL (GESTION 2024)

MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS MUNICIPALES



MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS MUNICIPALES (PAMPA Y VALLES)



Nº	TRAMOS	MAQUINARIA	LONGITUD (KM)	TOTAL COMBUSTIBLE LITROS
1	PUEBLO BAJO	MOTONIVELADORA	3,8	9644
2	BANDA B - ENTRE RIOS - SULTACA BAJA	MOTONIVELADORA	9,15	
3	LAS FLORES- SAN SEBASTIAN-SANTIAGO DE JOLENCIA-JOLENCIA CENTRO-JOLENCIA-MIRA FLORES-LOS ALAMOS	MOTONIVELADORA	24,37	
4	PUEBLO ALTO	MOTONIVELADORA	2,5	
8	LA KHASKA - SAN MARCELO - HUAJLAYA	PALA CARGADORA	24,5	
		MOTONIVELADORA		
10	LA KHASKA - EL QUEMADO - LA AGUADA - TANGOYA	PALA CARGADORA	34,2	
		MOTONIVELADORA		
14	CRUCE BUENA VISTA CENTRO - COCHALOMA	MOTONIVELADORA	10,9	
15	CHICHAYO - PORTILLO	PALA CARGADORA	10,2	
		MOTONIVELADORA		
16	NUEVA ESPERANZA - QUIRUSILLAS	MOTONIVELADORA	9	
17	CHILLAJARA - PUCARA DE YATINA - YATINA	MOTONIVELADORA	14,14	
19	SANTA ROSA - CHICHAPAMPA	PALA CARGADORA	11,1	
		MOTONIVELADORA		
TOTALES			153,86	9644



MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SECTOR DE LAS PAMPAS



Mantenimiento de
calles en el barrio
Litoral

Mantenimiento de caminos en
Jolencia





MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SECTOR DE LOS VALLES



Mantenimiento de caminos en Tangoya



Mantenimiento de caminos en la khaska



Mantenimiento de caminos en Huajlaya



Mantenimiento de caminos en Lampazar



TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS MUNICIPALES EN EL SECTOR LOS VALLES EN EPOCA DE LLUVIA



Nº	COMUNIDAD	MAQUINARIA	TOTAL COMBUSTIBLE/LITROS
1	CHICHAPAMPA	RETROEXCAVADORA	10166
2	CHILLAJARA	RETROEXCAVADORA	
3	PUCARA DE YATINA	RETROEXCAVADORA Y PALA CARGADORA	
4	YATINA	RETROEXCAVADORA Y PALA CARGADORA	
5	PORTILLO	PALA CARGADORA	
6	COCHALOMA	RETROEXCAVADORA	
7	TANGOYA	RETROEXCAVADORA	
8	LA AGUADA	RETROEXCAVADORA	
9	QUEMADO	RETROEXCAVADORA	
10	SAN PEDRITO	RETROEXCAVADORA	
11	KHASKA	PALA CARGADORA	
12	SAN MARCELO	RETROEXCAVADORA	
13	HUAJLAYA	PALA CARGADORA	
14	LAMPAZAR	PALA CARGADORA	
15	PAKAY	PALA CARGADORA	
16	SAN GREGORIO	EXCAVADORA	
17	SAN ANDRES	EXCAVADORA	



LIMPIEZA DE DERRUMBES OCASIONADO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR DE LOS VALLES



Limpieza de derrumbe en Pakay



Limpieza de derrumbe en Portillo



Limpieza de derrumbe en Chillajara Baja



Limpieza de derrumbes en San Andrés (angola)



APOYOS ADICIONALES CON COMBUSTIBLE EN EL MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS MUNICIPALES



Nº	COMUNIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO CON MAQUINARIA	TOTAL COMBUSTIBLE/LITROS
1	COMUNIDAD LAMPAZAR	NIVELACION DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE COLEGIO	840
2	COMUNIDAD PORTILLO	NIVELACION DE LOTE PARA CONSTRUCCION DE CANCHA	400
3	COMUNIDAD TANGOYA	APOYO A SEDCAM PARA LIMPIEZA DE CAMINO	600
4	COMUNIDAD SAN PEDRITO	APOYO A MAQUINA PARTICULAR EN LIMPIEZA DE CAMINOS	800
5	SUB CENTRALIA EL PARAISO	APLANAMIENTO DE CANCHA	200
6	COMUNIDAD QUIRUSILLAS	APERTURA DE CAMINO, APLANEAMIENTO DE CANCHA	300
7	COMUNIDAD DE PORTILLO	APOYO A CULPINA PARA LA LIMPIEZA DE CAMINO	200
TOTAL			3340



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS



Nº	DETALLE	MAQUINARIA
1	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RETROEXCAVADORA
2	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL	
3	CONTRATACION DE SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL DIFERENCIAL DELANTERO	
4	COMPRA DE DRIVE	
5	CONTRATACION DE SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA	
6	CONTRATACION DE SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE MOTOR	
7	CONTRACION DE SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL SISTEMA DE FRENO	
8	CONTRATCION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION	
9	ADQUISICION DE REPUESTOS UÑAS, PASADORES Y SEGUROS	
10	ADQUISICION DE BOMBIN Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	
11	COMPRA DE CUELLO CARGA	
12	RECONSTRUCCION DE LA OREJA DE BOTELLON	
13	CONTRATACION DE SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CUBOS DE LA CORONA	
14	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL AUTOMATICO	



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS



15	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MOTONIVELADORA
16	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL DIFERENCIAL DELANTERO	
17	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA	
18	ADQUISICION DE REPUESTOS UÑAS, PASADORES Y SEGUROS	
19	ADQUISICION DE FILTRO TRAMPERA	
20	ADQUISICION DE PIVOTE DE TORNAMESA	
21	ADQUISICION DE ANTICONGELANTES	
22	COMPRA DE DOS CAMARAS	
23	COMPRA DE FOCOS Y MANGUERAS	
24	REPARACION DEL MULTIPLE DE ESCAPE	
25	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PALA CARGADORA
26	COMPRA DE FILTROS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL	
27	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA PALANCA DE CAMBIO	
28	COMPRA DE UÑAS	
29	COMPRA DE ACEITES	



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS




30	CONTRATACION DE SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION	CAMIONETA NISAN FRONTIER
31	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOR	
32	COMPRA DE REPUESTOS	
33	ADQUISICION DE LLANTAS	
34	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS MANT. PREV.	
35	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE LA VOLQUETA HINO	VOLQUETA HINO
36	COMPRA DE LLANTAS	



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS MAQUINARIAS



Reparación del sistema de transmisión (Inca Pujyu)

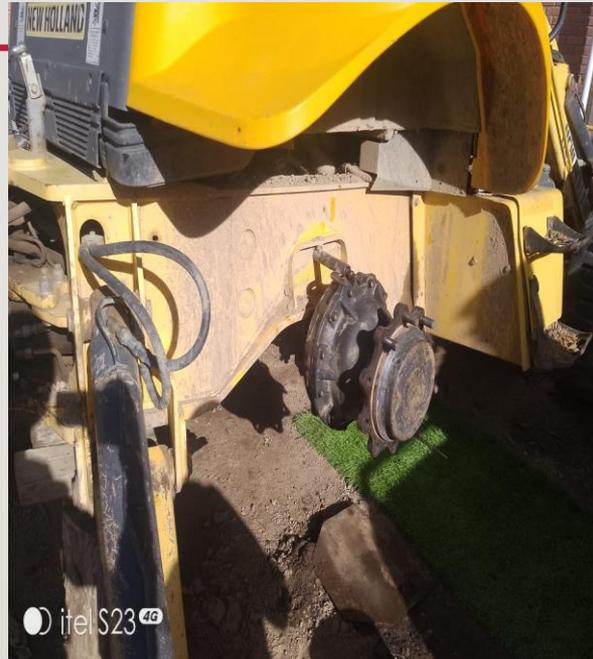

Reparación del sistema de frenos (Alcaldía)



Reparación del diferencial (Alcaldía)



Reparación del sistema de combustible (Waycoma)



Mantenimiento y reparación general (Alcaldía)



Reparación de la palanca de cambio (Pakay)



Mantenimiento preventivo (San Gregorio)



RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DENTRO DE LA CATEGORIA 180 0 001 FTE 41-113

PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL (Bs)	INCREMENTO	PRESUPUESTO NUEVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	SALDO	%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	0,00	70659,20	70659,20	61308,66	9350,54	87%
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIO	0,00	139889,66	139889,66	131450,18	8439,48	94%
VIAICOS POR VIAGES AL INTERIOR DEL PAIS	10000,00	0,00	10000,00	9468,00	532,00	95%
CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	226200,00	0,00	226200,00	212778,00	13422,00	94%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	0,00	35747,17	35747,17	29043,02	6704,15	81%
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	139889,66	139889,66	131450,18	8439,48	94%
TOTAL	236200,00	386185,69	622385,69	575498,04	46887,65	92%



RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DENTRO DE LA CATEGORIA 180 0 001 FTE 41-119

PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL (Bs)	INCREMENTO	PRESUPUESTO NUEVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	SALDO	%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	75000,00	3083,00	78083,00	78083,00	0,00	100%
SERVICIOS MANUALES	3000,00	5551,00	8551,00	8543,25	7,75	100%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	110000,00	25691,00	135691,00	127638,66	8052,34	94%
LLANTAS Y NEUMATICOS	81984,00	0,00	81984,00	81984,00	0,00	100%
HERRAMIENTAS MENORES	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100%
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100800,00	13311,00	114111,00	113673,00	438,00	100%
TOTAL	373784,00	47636,00	421420,00	412921,91	8498,09	98%

RENDICION PUBLICA
DE CUENTA FINAL
(GESTION 2024)



APERTURA DE CAMINOS
VEHICULARES DE INTERCONEXION
MUNICIPIO DE INCAHUASI





TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE QUIRUSILLAS **SECTOR WAYCOMA**



<i>TRAMOS</i>	<i>SECTORES</i>	<i>MAQUINARIA</i>	<i>LONGITUD (KM)</i>	<i>CONTRAPARTE</i>
TRAMO 1	WAYCOMA	TRACTOR ORUGA JII	4,6	<i>COMBUSTIBLE DE LA COMUNIDAD</i>
TOTAL			4,6	0

TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE LAMPAZAR **SECTOR SAN GERONIMO Y PALTA LOMA**

<i>TRAMOS</i>	<i>SECTORES</i>	<i>MAQUINARIA</i>	<i>LONGITUD (KM)</i>	<i>TOTAL COMBUSTIBLE/ LITROS</i>
TRAMO 1	SAN GERONIMO	TRACTOR ORUGA JII	4,3	5600
TRAMO 2	PALTA LOMA	TRACTOR ORUGA JII	1,1	
TOTAL			5,4	5600



ACTIVIDADES EN LA APERTURA DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE QUIRUSILLAS Y LAMPAZAR



APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD
DE QUIRUSILLAS SECTOR DE WAYCOMA



APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD
DE LAMPAZAR SECTOR SAN GERONIMO



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS



1	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO HIDRAULICO	TRACTOR ORUGA JII
2	ADQUISICION DE SENSOR Y VALVULA	
3	COMPRA DE DOS VALDES DE ACEITES HIDRAULICO	
4	CONTRATACION DE SERVICIO PARA RATIFICAR ARTICULACIONES MAS COMPRA DE REPUESTO	
5	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES	
6	REPARACION DE LA UNIDAD DE CONTROL	
7	EVALUSION EN SISTEMA ELECTRONICO Y COMBUSTIBLE	
8	SERVICIO DE TORNERIA PARA EXTRER PERNO ROTO	





RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DENTRO DE LA CATEGORIA 180 0 005 FTE 41-113

PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL (Bs)	INCREMENTO	PRESUPUESTO NUEVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	SALDO	%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	0,00	7857,42	7857,42	7856,00	1,42	100%
FLETES Y ALMACENAMIENTO	0,00	7142,90	7142,90	7142,90	0,00	100%
CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	29200,00	6849,00	36049,00	31390,00	4659,00	87%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	20000,00	34260,39	54260,39	43283,00	10977,39	80%
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	25527,00	25527,00	25445,00	82,00	100%
TOTAL	49200,00	81636,71	130836,71	115116,90	15719,81	88%

RENDICION PUBLICA
DE CUENTAS FINAL
(GESTION 2024)



APERTURA DE CAMINOS
VECINALES SAN GREGORIO - SAN
ANDRES - LAGUNILLAS






AVANCE EN LA APERTURA DE CAMINOS VECINALES SAN GREGORIO SA ANDRES - LAGUNILLAS



Nº	TRAMOS	MAQUINARIA	LONGITUD (Mts)	TOTAL COMBUSTIBLE/LITROS
TRAMO 1	GALLINERO WASI - ESCUELA DE SAN ANDRES	EXCAVADORA SK 210, COMPRESORA	4,7	12000
TOTAL			4,7	12000

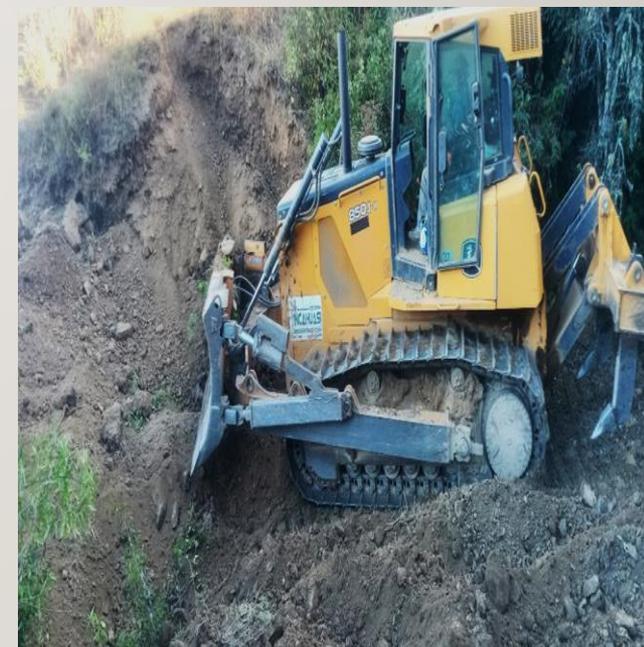

Trabajos en la apertura de caminos tramo Gallinero Wasi



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS



1	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL	TRACTOR ORUGA JI
2	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL CONTROLADOR	
3	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
4	ADQUISICION DE REPUESTOS LUBRICANTES	
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
6	ARMADO DE ARTICULACIONES	
7	COMPRA DE PUNTERAS	
8	REPARACION DE SILINDRO Y COMRA DE REPUESTO	
9	COMPRA DE LUBRINTES Y REPUESTOS PARA MANT. PREV.	EXCAVADORA COBELCO
10	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
11	COMPRA DE UÑAS, PASADOR, SEGUROS	
12	COMPRA DE CORREA, RODAMIENTO	
13	COMPRA DE PLANCH, ELECTRODOS Y DISCOS DE CORTE	



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA TRACTOR ORUGA JI



MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA



RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DENTRO DE LA CATEGORIA 180 146 FTE 41-119

PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL (Bs)	INCREMENTO	PRESUPUESTO NUEVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	SALDO	%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	0,00	15815,33	15815,33	15452,29	363,04	98%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	0,00	44813,00	44813,00	44803,90	9,10	100%
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	37604,20	37604,20	35954,15	1650,05	96%
TOTAL	0,00	98232,53	98232,53	96210,34	2022,19	98%



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN



ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI



CAT.PROG 160 0 001 ALUMBRADO DE CALLES Y PLAZAS (ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS)

ADQUISICION DE
EQUIPOS ELECTRICOS
PARA CAMBIOS DE
LUMINARIAS ANTIGUAS
A LUMINARIAS LEDS EN
CENTRO POBLADO
INCAHUASI

FF-OF [Código]	Presupuesto Vigente [Bs.]	Presupuesto Ejecutado [Bs.]	Saldo [Bs.] [2024]	% Ejec.
COP. TRIB.	15.000,00	14.993,10	06,90	99,95
IDH	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	14.993,10	06,90	99,95



MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES CRITICOS EN EL CENTRO POBLADO, SIN REGISTRO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENDE CORPORACION



CAT.PROG 330 0 001 ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION COMUNIDADES RURALES

**COMPRA DE
MATERIALES
ELECTRICOS PARA
DAR SOLUCION A
LUMINARIAS EN MAL
ESTADO.**


FF-OF [Código]	Presupuesto Vigente [Bs.]	Presupuesto Ejecutado [Bs.]	Saldo [Bs.] [2024]	% Ejec.
IDH	20.000,00	19.999,35	464,65	97,73
COP. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	19.999,35	464,65	97,73



MEJORAMIENTO, CAMBIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ANTIGUAS A NUEVAS LUMINARIAS LED EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI, CAMBIOS DE ALUMBRADOS PUBLICOS FAROLAS LEDS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI.



FF-OF [Código]	Presupuesto Vigente [Bs.]	Presupuesto Ejecutado [Bs.]	Saldo [Bs.] [2024]	% Ejec.
COP. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
IDH	5.000,00	4,852,93	147,07	97,06
TOTAL	5.000,00	4,852,93	147,07	97,06



REALIZACION DE CANCELACIONES POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE INCAHUASI, POR QUE LOS USUARIOS QUE CANCELN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO NO CUBRE EN SU TOTALIDAD EL GASTO.

**CAT.PROG 33 0 001
ALUMBRADO PUBLICO Y
ELECTRIFICACION
COMUNIDADES RURALES
(Herramientas Menores)**

FF-OF [Código]	Presupuesto Vigente [Bs.]	Presupuesto Ejecutado [Bs.]	Saldo [Bs.] [2024]	% Ejec.
COP. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
IDH	10.000,00	9.988,51	11,49	99,88
TOTAL	10.000,00	9.988,51	11,49	99,88

**HERRAMIENTAS
ADQUIRIDAS PARA EL
AREA DE OBRAS
PUBLICAS.**





ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE INCAHUASI



**CULMINACION DE RENOVACIONES DE
LINEAS DE REDES DE BAJA TENSION EN
COMUNIDADES RURALES DE LA PAMPA
DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI**



PROYECTO “AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN INCAHUASI PORTILLO – EL FUERTE Y PORTILLO – LAMPAZAR

PROYECTO	Importe [Bs.]	Porcentaje
TRAMO PORTILLO-EL FUERTE	8.919.590,25	0%
TRAMO PORTILLO-LAMPAZAR	8.416.610,56	0%
Beneficiarios	16 COMUNIDADES A BENEFICIARCE	
Total [Bs.]		0%

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

TRAMO PORTILLO EL FUERTE: PORTILLO BAJO, BUENA VISTA CENTRO, BUENA VISTA TORRE, COCHALOMA, VERANO, TANGOYA, EL FUERTE, PUCARA DE YATINA Y YATINA. (9 COMUNIDADES BENEFICIARIAS)

TRAMO PORTILLO LAMPAZAR: SAN MARCOS, SAN MARCELO, HUAJLAYA, LAMPAZAR, SAN PEDRITO, EL QUEMADO Y LA AGUADA (7 COMUNIDADES BENEFICIARIAS)

SITUACIÓN ACTUAL:

LOS DOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION YA CUENTA CON LOS ESTUDIOS A DISEÑO FINAL, EN REVICION PARA SU EJECUCION YA QUE SOLO FALTA LA LICENCIA AMBIENTAL.



PERFIL ELABORADO GESTION 2024

REALIZACION DE PERFIL DE PROYECTO "AMPLIACION-RENOBACION DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE MIRA FLORES (SECTOR4), AMPLIACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENCITO, REOVACION EN COMUNIDADES DE PUEBLO ALTO"

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

	Importe [Bs.]	Porcentaje
ENDE CORPORACION.	-	-
Beneficiarios	COMUNARIOS	-
Total [Bs.]	-	-

POBLACION A BENEFICIARSE CON AMPLIACION Y RENOVACION DE LINEAS ELECTRICAS.:

- ✓ LAS COMUNIDADES DE MIRA FLORES SE PREVEE QUE SE REALIZARA RENOVACION Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION.
- ✓ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ALTO SE PREVEE REALIZAR LA RENOVACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAS.
- ✓ EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENCITO SE PREVEE AMPLIAR LA ENERGIA EEELECTRICA EN BAJA TENSION.

SITUACIÓN

ACTUAL:

1. SE ELABORO EL PERFIL DE PROYECTO, SE RALIZO LA ASISTENCIA TECNICA PARA PODER LLEVAR ADELANTE ESTE PROYECTO, CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PLANOS ELECTRICOS.
2. SE PRECENTO EN OFICINAS DE ENDE CORPORACION

RESULTADO QUE SE PUEDE OBTENER:

MEJORAMIENTO HACIA LAS FAMILIAS VENEFIARIAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES

**SE PRETENDE MEJORAR LA RED DE
ENERGIA ELECTRICA PARA SATISFACER
LA CALIDAD DE SERVICIO QUE NOS
BRINDA ENDE CORPORACION**



PERFIL ELABORADO GESTION 2024

“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION CON PUESTO DE TRANSFORMADOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA SUB CENTRALIA DE PUEBLO ALTO INCAHUASI”

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

	Importe [Bs.]	Porcentaje
G.A.M.INCAHUASI	133.050,97	0.00%
Beneficiarios	SUB CENTRALIA DE PUEBLO ALTO	0.00%
Total [Bs.]	-	-

POBLACION A BENEFICIARCE CON ESTA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA UN POZO DE AGUA POTABLE

- ✓ LAS COMUNIDADES A BENEFICIARCE SON (EL PUENTE, EL SAUZAL, BELLA VISTA, LOS PINOS Y PUEBLO ALTO CENTRO)
- ✓ EN LA SUB CENTRALIA DE PUEBLO ALTO SE TIENE UNA CARENCIA DE ESTE LIQUIDO ELEMENTAL DEL AGUA POTABLE, REQUERIENDO ASI EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA PARA ABASTECER CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DICHA SUB CENTRALIA DE PUEBLO ALTO DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI

SITUACIÓN

ACTUAL:

1. SE ELABORO EL PERFIL DE PROYECTO MAS LA ACTUALIZACION, SE RALIZO LA ASISTENCIA TECNICA, LEBANTAMIENTO DE PUNTOS GEOGRAFICOS PARA EL TRAZADO DE LA LINEAS ELECTRICAS CON UN PUESTO DE TRANFORMACION.
2. SE PRECENTO EN OFICINAS DE ENDE CORPORACION

RESULTADO QUE SE PUEDE :OBTENER

BENEFICIAR DE ESTE PROYECTO CON ALIMENTACION DE ELECTRICA PARA SUSTRARER AGUA POTABLE PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A TODA LA SUB CENTRALIA DE PUEBLO ALTO.

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE INCAHUASI.

	Importe [Bs.]	Porcentaje
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS		0%
Beneficiarios	COMUNIDADES RURALES	-
Total [Bs.]		0%

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

COMUNIDADES DE:

PUEBLO BAJO, BANDA INCAHUASI, PUCARA DE YATINA, SAN LORENCITO, MIRA FLORES, BANDA INCAHUASI UNO, SAN MARCELO, SAN MARCOS, SAN PEDRITO, EL QUEMADO, LA AGUADA, HUAJLAYA, LAMPAZAR, SAN GREGORIO, SAN ANDRES, LAGUNILLAS, FRUCTOSO OLARTE, SAN BENITO Y LAS POLLAS (19 COMUNIDADES A BENEFICIARSE)

SITUACIÓN ACTUAL:

EL PROYECTO “ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL AREA RURAL MUNICIPIO DE INCAHUASI” SE ESPERA QUE SE APRUEVE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024



AREA DE TOPOGRAFIA

RENDICION
PUBLICA

FINAL - 2024



TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO **TOPOGRAFICO**

SE REALIZO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA APERTURA DE CAMINOS SECTORIALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEPENDIENTE AL DISTRITO DE PORTILLO:

- **PORTILLO.**
- **BUENA VISTA CENTRO**
- **BUENA VISTA TORRE**
- **SAN MARCOS**
- **COCHALOMA**


COMUNIDAD DE PORTILLO

SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 7 TRAMOS CORRESPONDIENTE A UN TOTAL DE 5,025 KM DE LONGITUD



COMUNIDAD DE BUENA VISTA CENTRO

SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 8 TRAMOS QUE ASCIENDE UN TOTAL DE 5,410 KM DE LONGITUD

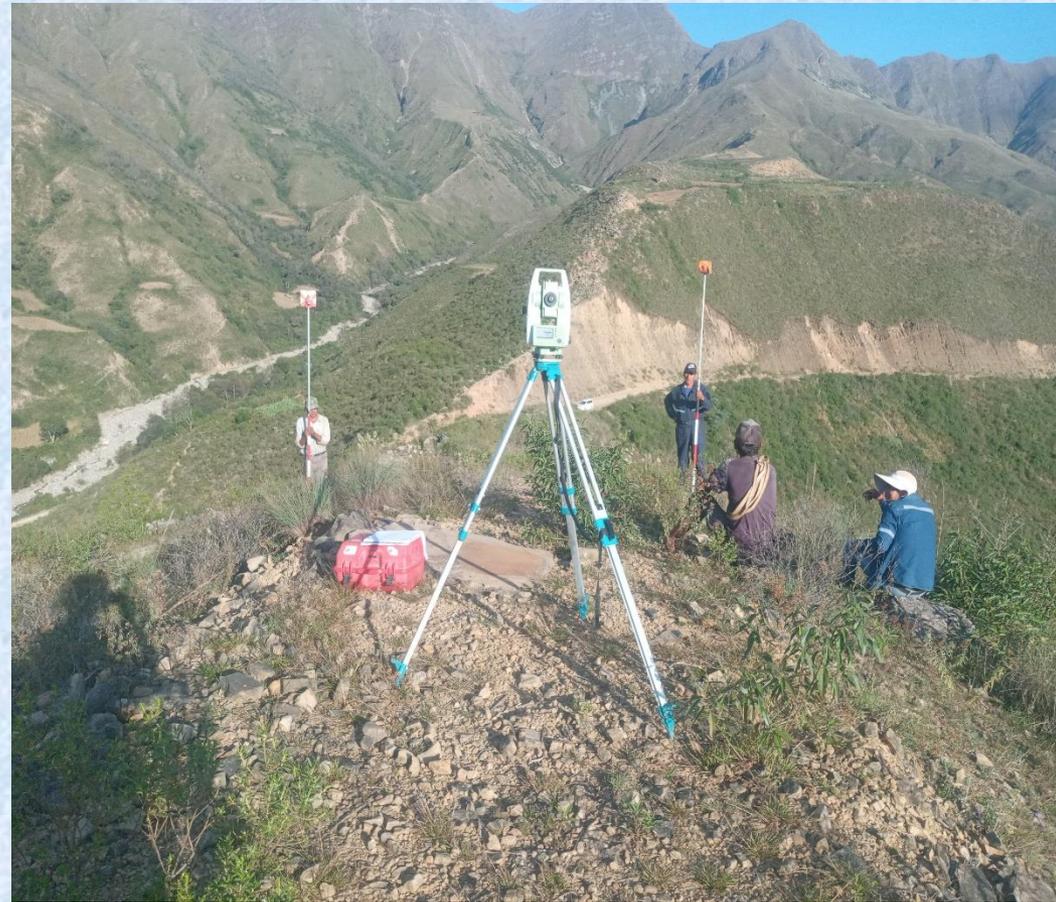

COMUNIDAD DE BUENA VISTA TORRE

SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 11 TRAMOS HACIENDO UN TOTAL DE 8,29 KM DE LONGITUD



COMUNIDAD DE SAN MARCOS

SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 5 TRAMOS HACIENDO UN TOTAL DE 18,493 KM DE LONGITUD



COMUNIDAD DE COCHALOMA

**SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 9 TRAMOS
HACIENDO UN TOTAL DE 9,40 KM DE LONGITUD**



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA COMUNIDAD DE MIRA FLORES

**SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS TOMAS PARA UN
NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRA FLORES**



LEV.TOP. DE FRANJA O SENDA






TOMA I



DIGITALIZACION DE PLANOS

- ❑ Elaboración de planos comunales para la obtención de la personería jurídica de las siguientes comunidades y barrios.

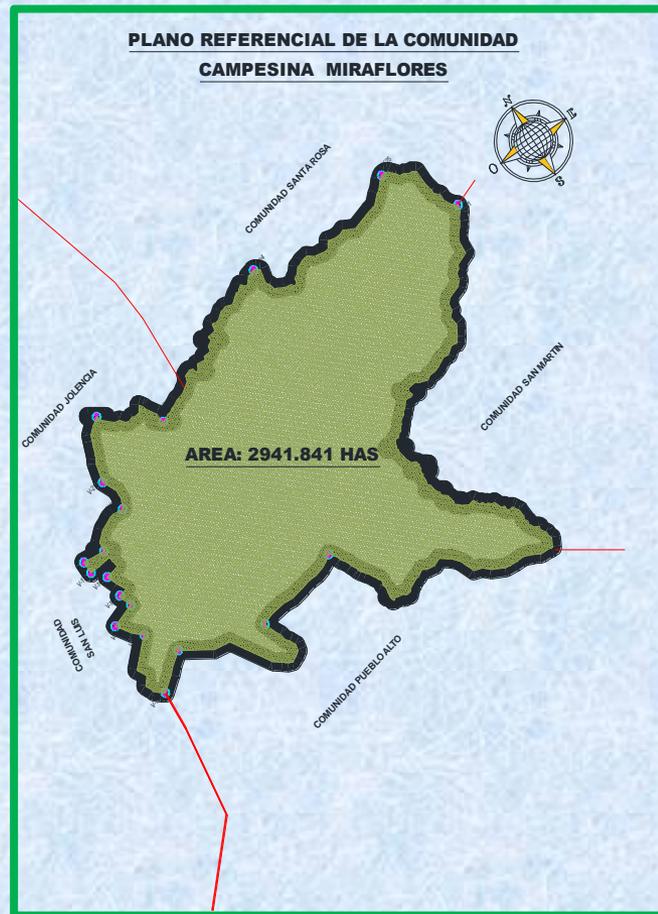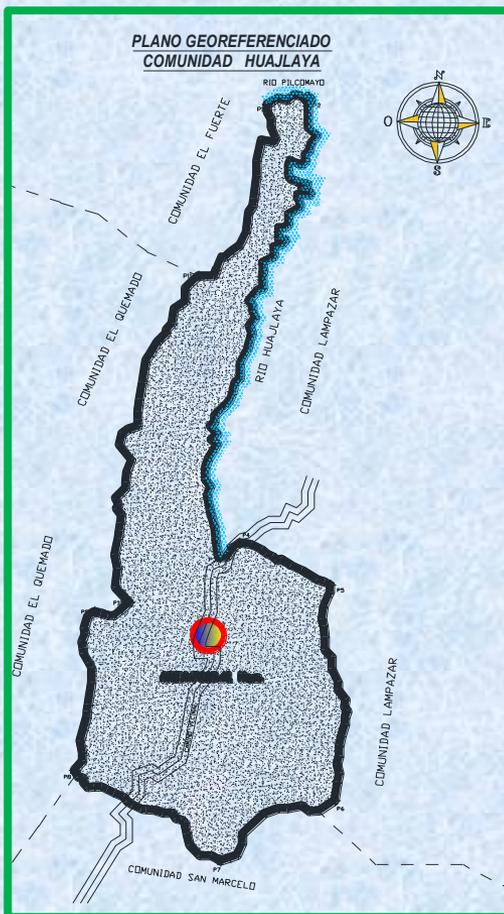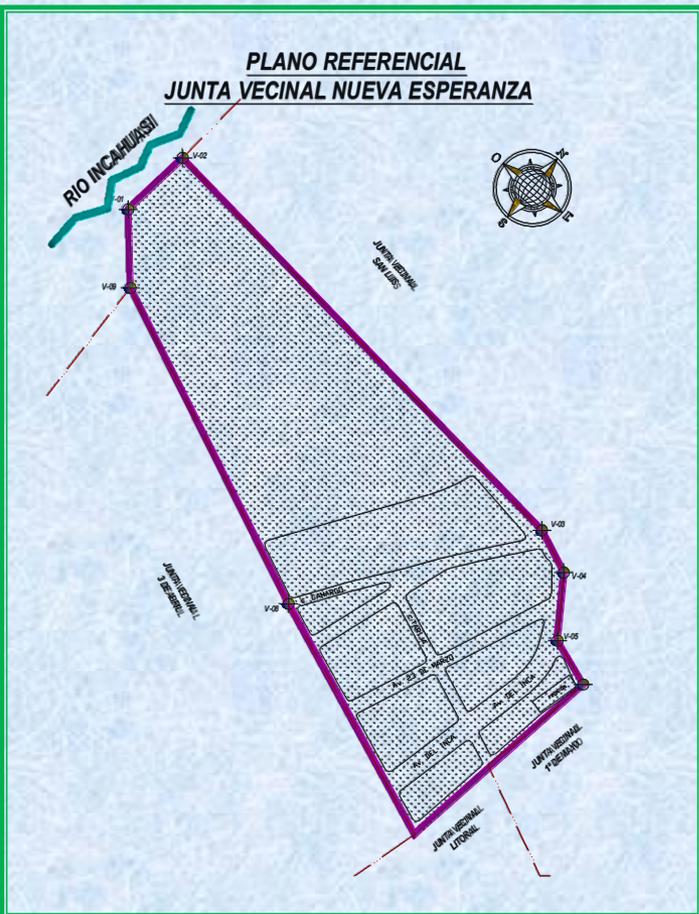

APERTURA DE CAMINOS SECTORIALES EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO

- EN FECHA 19 DE JUNIO DE LA GESTION 2024 SE DIO INICIO CON LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAMINOS SECTORIALES FINALIZANDO EN FECHA 15 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO.

RESUMEN TOTAL HORAS Y PRESUPUESTO POR TRAMO

Nº	TRAMOS	UNIDAD	LONG/TRAMO O EJECUTADO	HORAS TRAB. POR TRAMO	PRESUP/TRAMO		DESCUENTO / DIESEL/TRAMO			TOTAL/PRESUP/T RAMO
					PRECIO/HORA	TOTAL/PRESUP	LIT/HORA	TOTAL/LIT	BS/TRAMO	
1	TRAMO 1	ML	105,00	6,9	400	2764	16	110,56	411,28	2.352,72
2	TRAMO 2	ML	493,00	19,4	400	7760	16	310,40	1154,69	6.605,31
3	TRAMO 3	ML	462,00	21,4	400	8560	16	342,40	1273,73	7.286,27
4	TRAMO 4	ML	1904,00	48,5	400	19408	16	776,32	2887,91	16.520,09
5	TRAMO 5	ML	1105,00	32,7	400	13068	16	522,72	1944,52	11.123,48
6	TRAMO 6	ML	1763,00	192,7	400	77080	16	3083,20	11469,50	65.610,50
7	TRAMO 7	ML	216,00	13,0	400	5196	16	207,84	773,16	4.422,84
8	TRAMO 8	ML	545,00	42,5	400	17009,868	16	680,39	2531,07	14.478,80
TOTAL			6593,00	377,115		150845,9		6033,83	22445,87	128.400,00

- SE REALIZO LA APERTURA DE 8 TRAMOS HACIENDO UNA LONGITUD TOTAL DE EJECUCION DE 6,593 KM CON UN PRESUPUESTO DE 128.400,00 BS DE APERTURA DE CAMINO.

CANCELACIONES POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA APERTURA DE CAMINOS SECTORIALES EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO

- SE REALIZO LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A TRES PLANILLAS DE ACUERDO AL AVANCE DE COMO SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO

Nº DE PLANILLA	Nº DE TRAMOS	LONGITUD TOTAL EJECUTADA	HORAS/TRABAJADAS	PRESUPUESTO TOTAL
PLANILLA 1	5	3,778	124	49.600,00
PLANILLA 2	1	1,763	125	50.000,00
PLANILLA 3	2	761	71	28.400,00
TOTAL	8	6,302	320	128.400,00

REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS




TRAMO 1




TRAMO 2



TRAMO 3

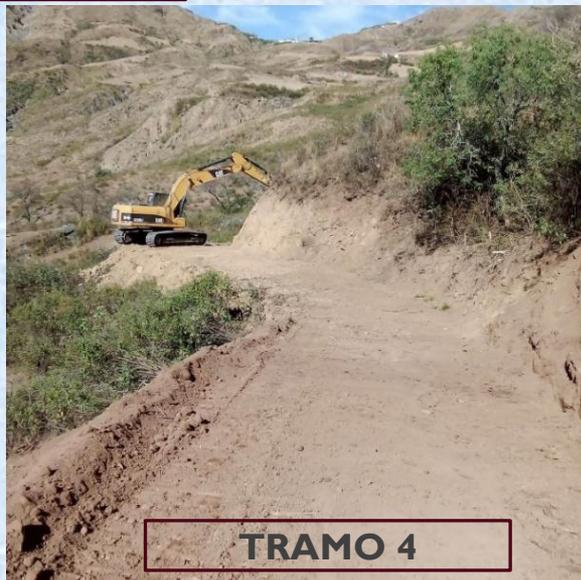

TRAMO 4

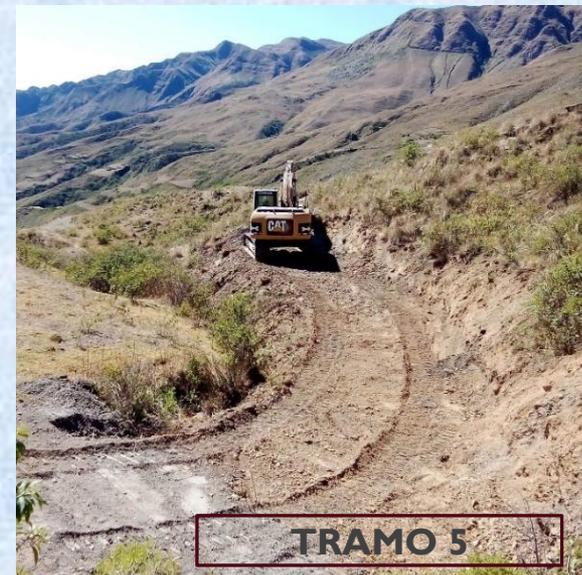

TRAMO 5

**TRAMO 6 PORTILLO - SECTOR
POTRERO (QUIRUSILLAS) CON
PRESENCIA DE ROCA
FRACTURADA**



**INSPECCION DE
LOS TRABAJOS EN
EJECUCION**

TRABAJOS EN EL AREA URBANA

- ❖ SE REALIZO TRABAJOS DE LINEA MUNICIPAL EN BASE A UN REPLANTEO CON EQUIPO DE ESTACION TOTAL.
- ❖ SE REALIZO TRABAJOS DE VERIFICACION DE LOTES Y CONSTRUCCIONES EN BASE A UN REPLANTEO DE VERTICES CON BMS DE REFERENCIA DE LA NUEVA RED GEODESICA MUNICIPAL



VERIFICACION DE VERTICES
DEL INMUEBLE DE LA
SEÑORA MIRIAN TAPIA

ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO

- Para un mejor rendimiento en el campo de la topografía y la ingeniería civil en el contexto rural y urbano se **SUGIERE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO TOPOGRAFICO (RECEPTOR GNSS RTK).**
- Para efectos de realizar los trabajos de verificación de lotes, construcciones, levantamiento topográficos para diferentes proyectos, replanteos de línea municipal, arrastre de coordenadas, etc. Por lo que actualmente se esta ejecutando los trabajos con **equipo prestado.**

EQUIPO EN MALAS
CONDICIONES



- **BATERÍAS EN MAL ESTADO (NO CARGA).**
- **DESCALIBRADO.**
- **PERDIDA DE DATOS DE LA MEMORIA INTERNA POR MOTIVOS DE CADA TIEMPO SE APAGA EL EQUIPO.**
